

Énoncé

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	<u>Ecriture des textes</u>	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

Questions :

- 1) Etablir la matrice des niveaux
- 2) Construire le diagramme GANTT
- 3) Présenter le graphe MPM
- 4) Determiner le chemin critique et la date de réalisation du projet

1) Etablir la matrice des niveaux

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

1	2	3	4	5	6	7	8

1) Etablir la matrice des niveaux

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

1	2	3	4	5	6	7	8
B							
C							
D							

1) Etablir la matrice des niveaux

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A						
C	E						
D							

1) Etablir la matrice des niveaux

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A						
C	E	F					
D							

1) Etablir la matrice des niveaux

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A						
C	E	F	H				
D							

1) Etablir la matrice des niveaux

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A						
C	E	F	H	G			
D							

1) Etablir la matrice des niveaux

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A						
C	E	F	H	G	I		
D							

1) Etablir la matrice des niveaux

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A						
C	E	F	H	G	I	J	
D							

1) Etablir la matrice des niveaux

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A						
C	E	F	H	G	I	J	K
D							

2) Construire le diagramme de GANTT

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	<u>Ecriture</u> des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

Tâches


A																																		
B																																		
C																																		
D																																		
E																																		
F																																		
G																																		
H																																		
I																																		
J																																		
K																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Durée

2) Construire le diagramme de GANTT

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

Tâches

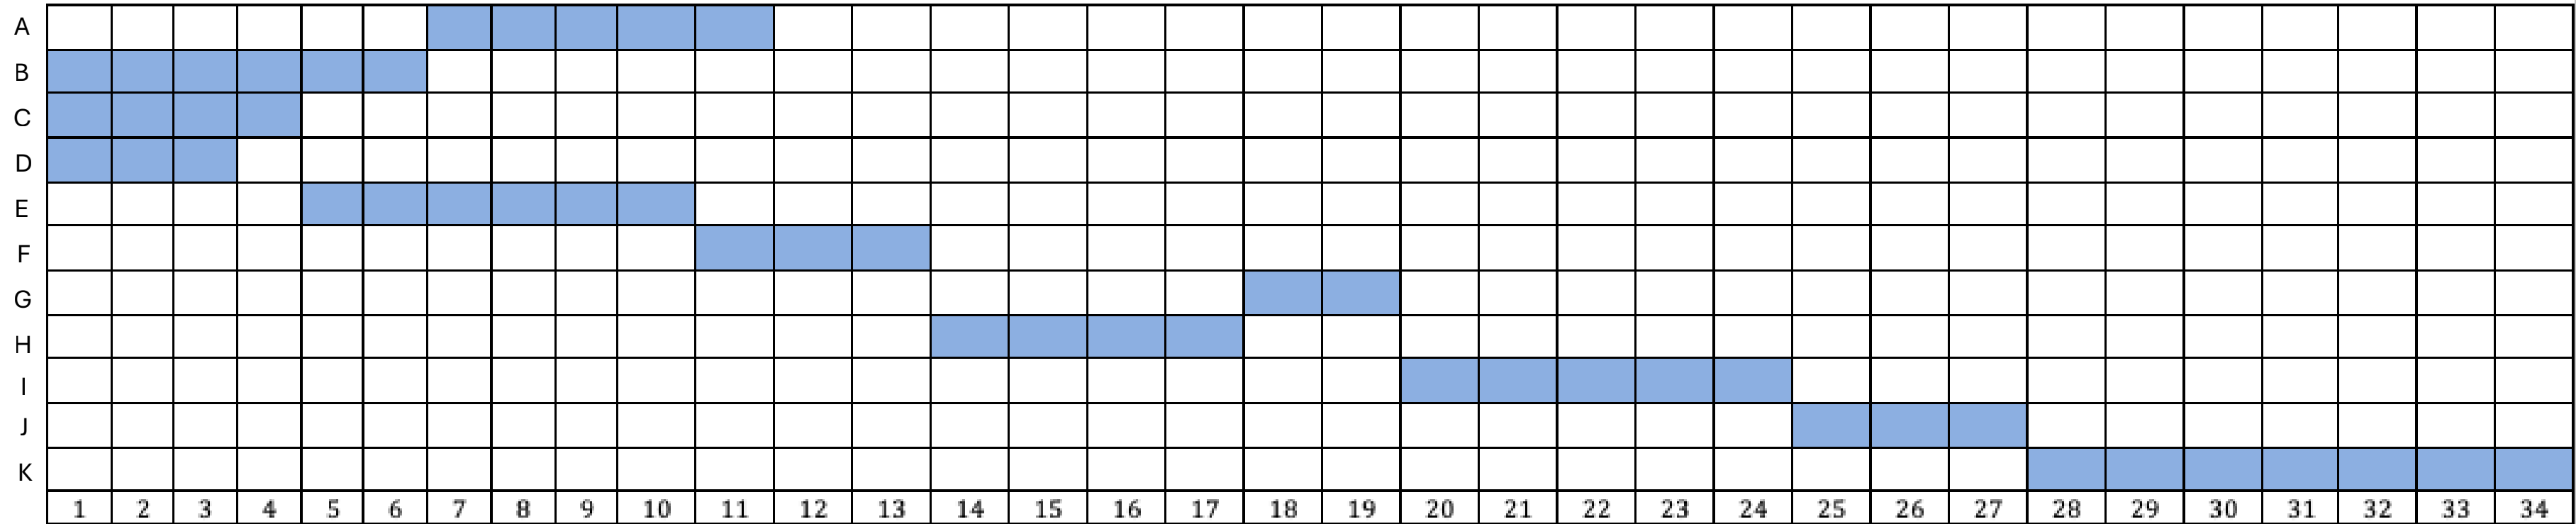


Durée

3) Présenter le graphe MPM

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A						
C	E	F	H	G	I	J	K
D							


TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

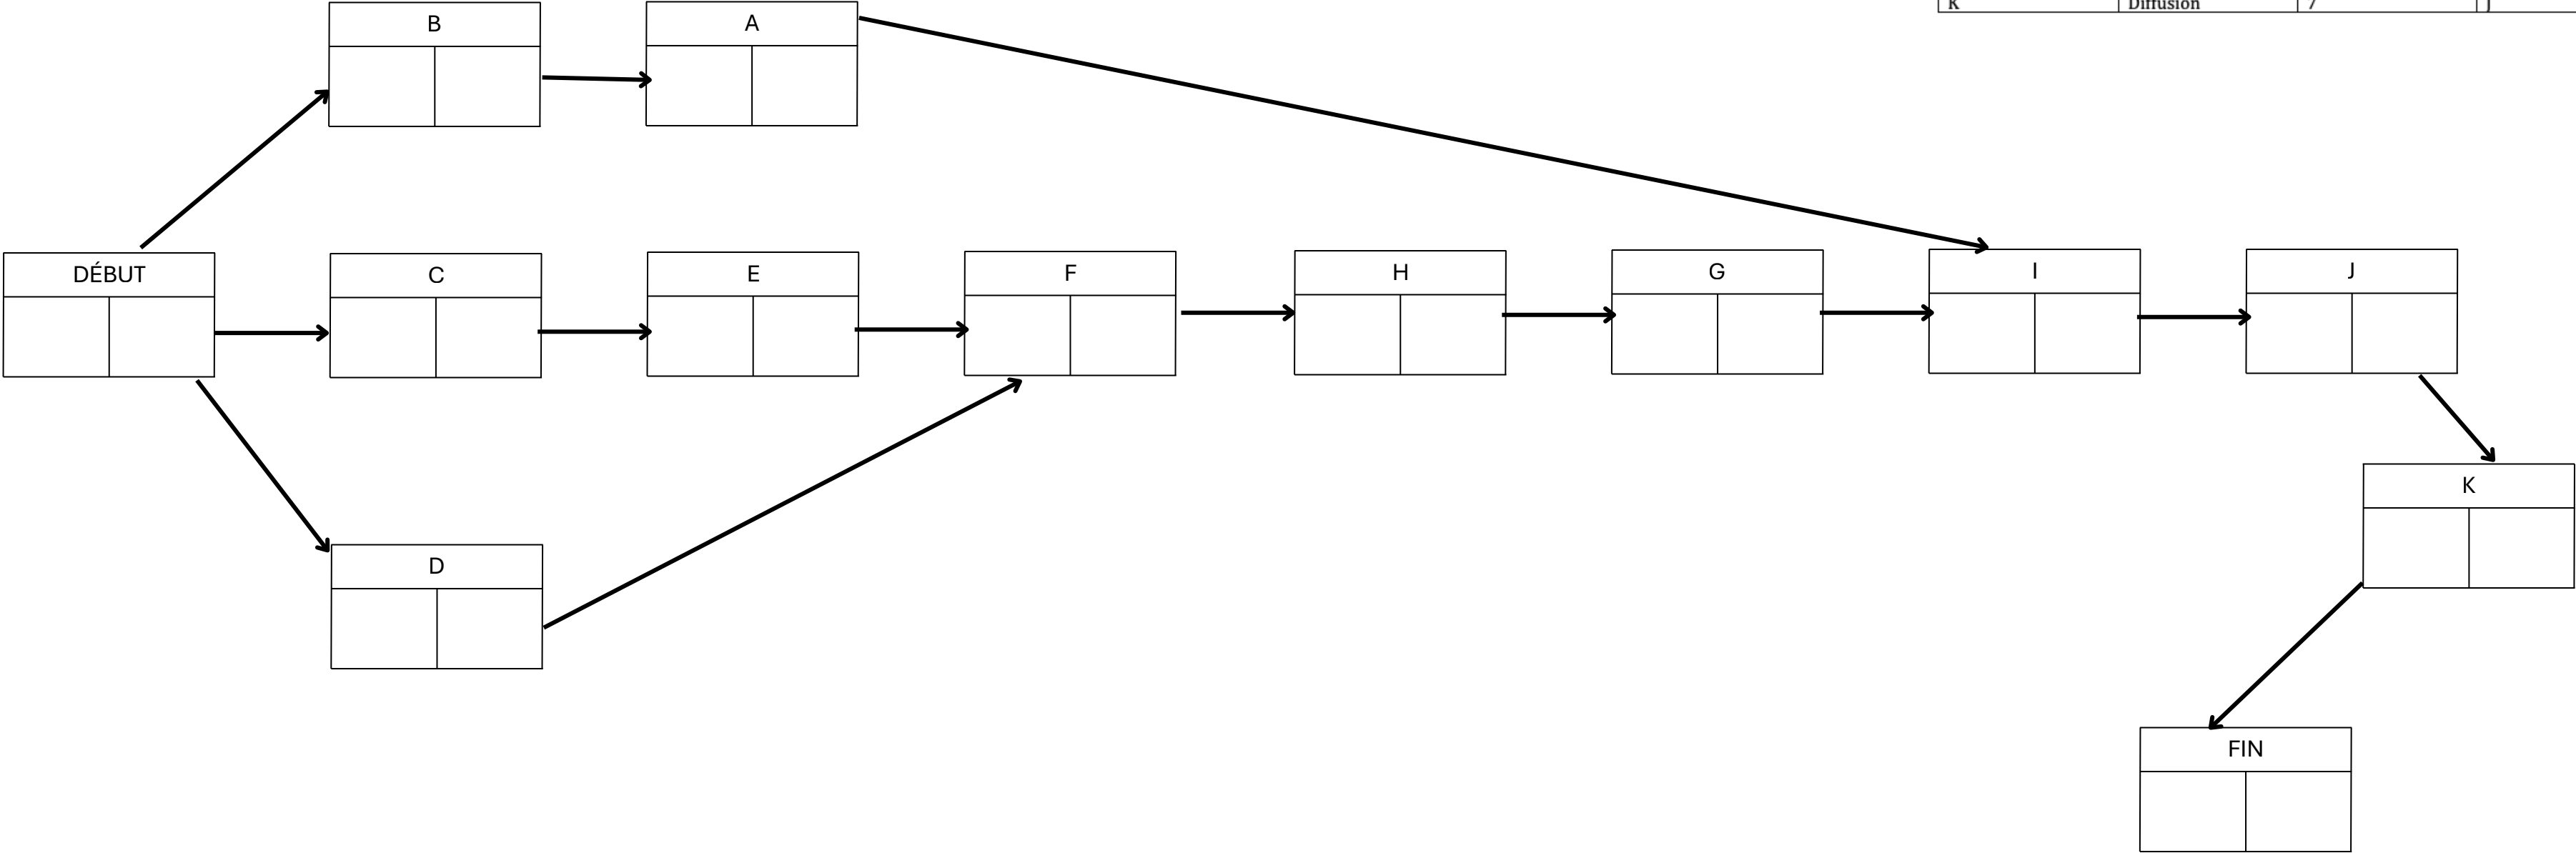

3) Présenter le graphe MPM

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A						
C	E	F	H	G	I	J	K
D							


TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

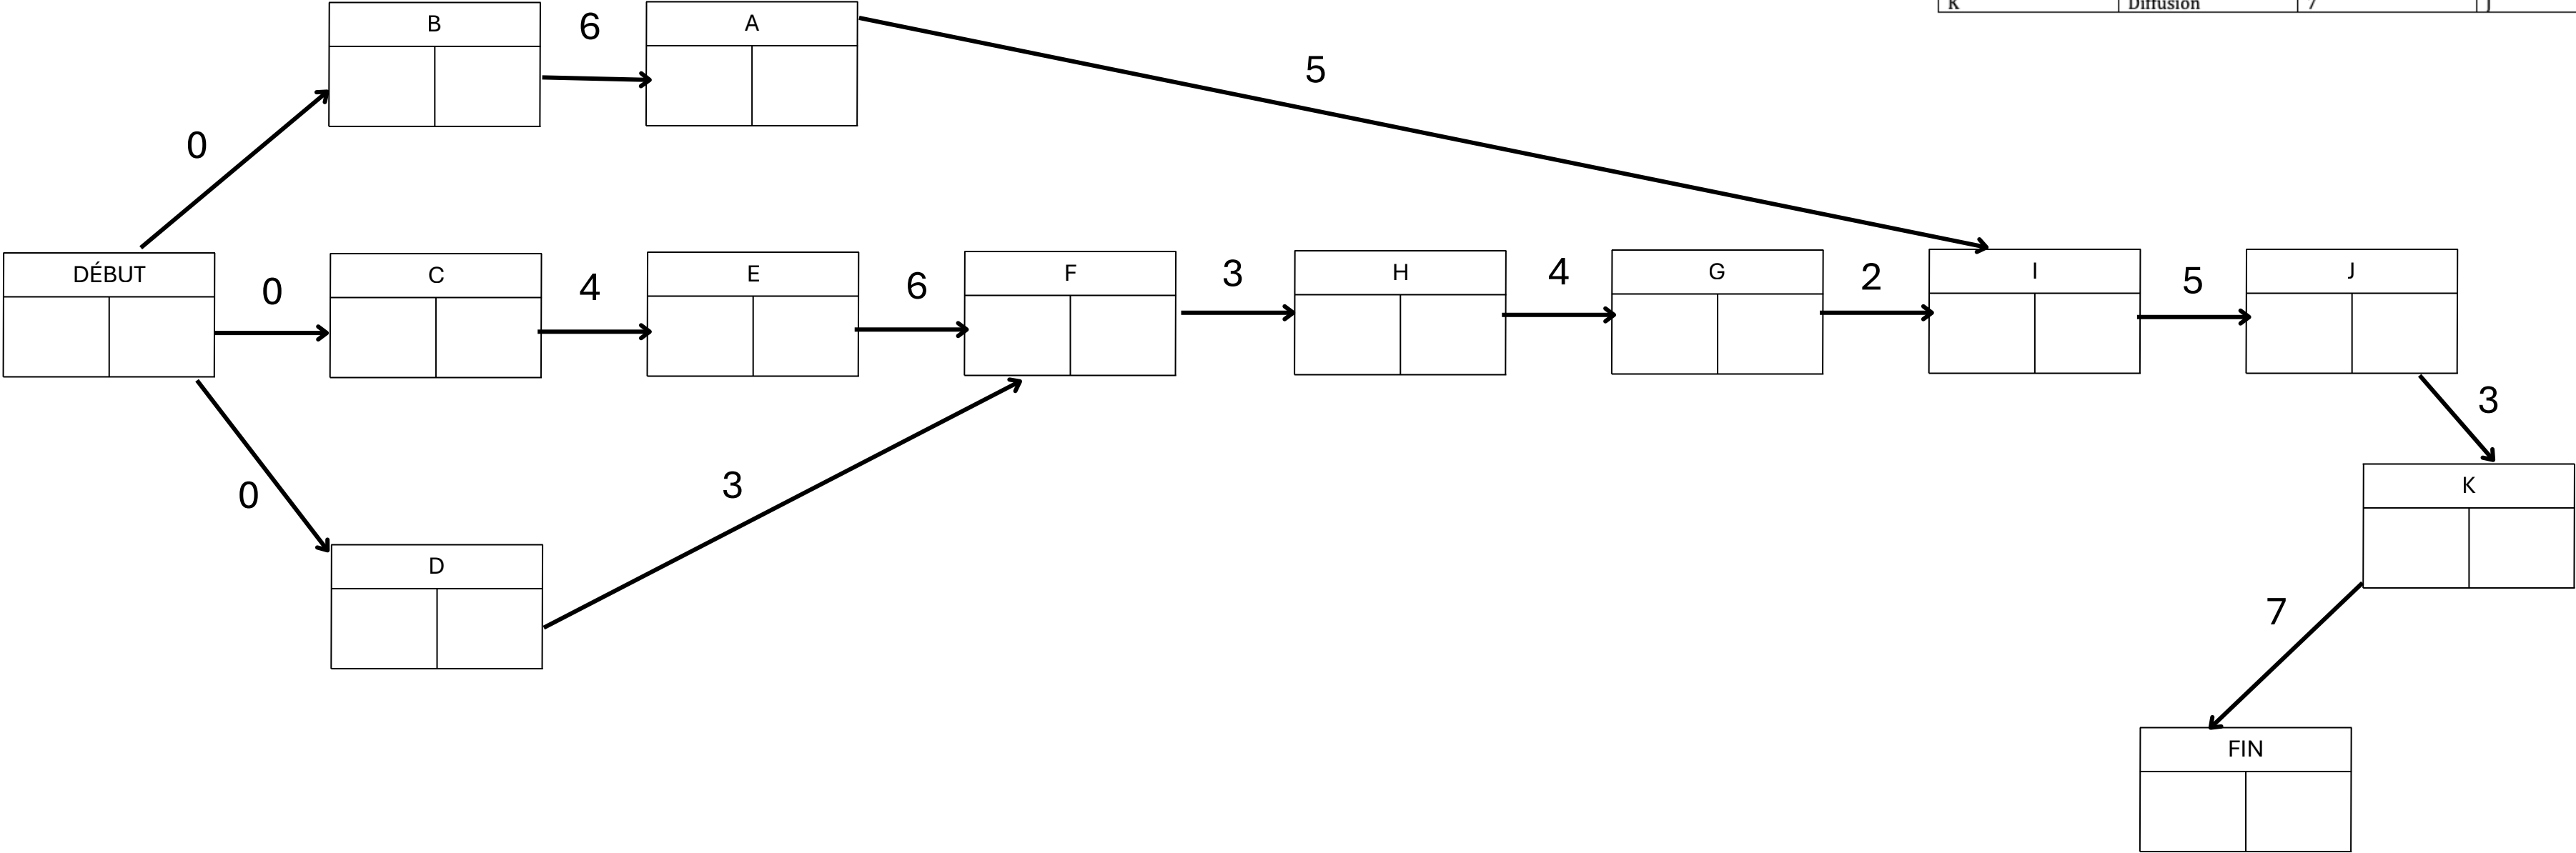

3) Présenter le graphe MPM

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A						
C	E	F	H	G	I	J	K
D							

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

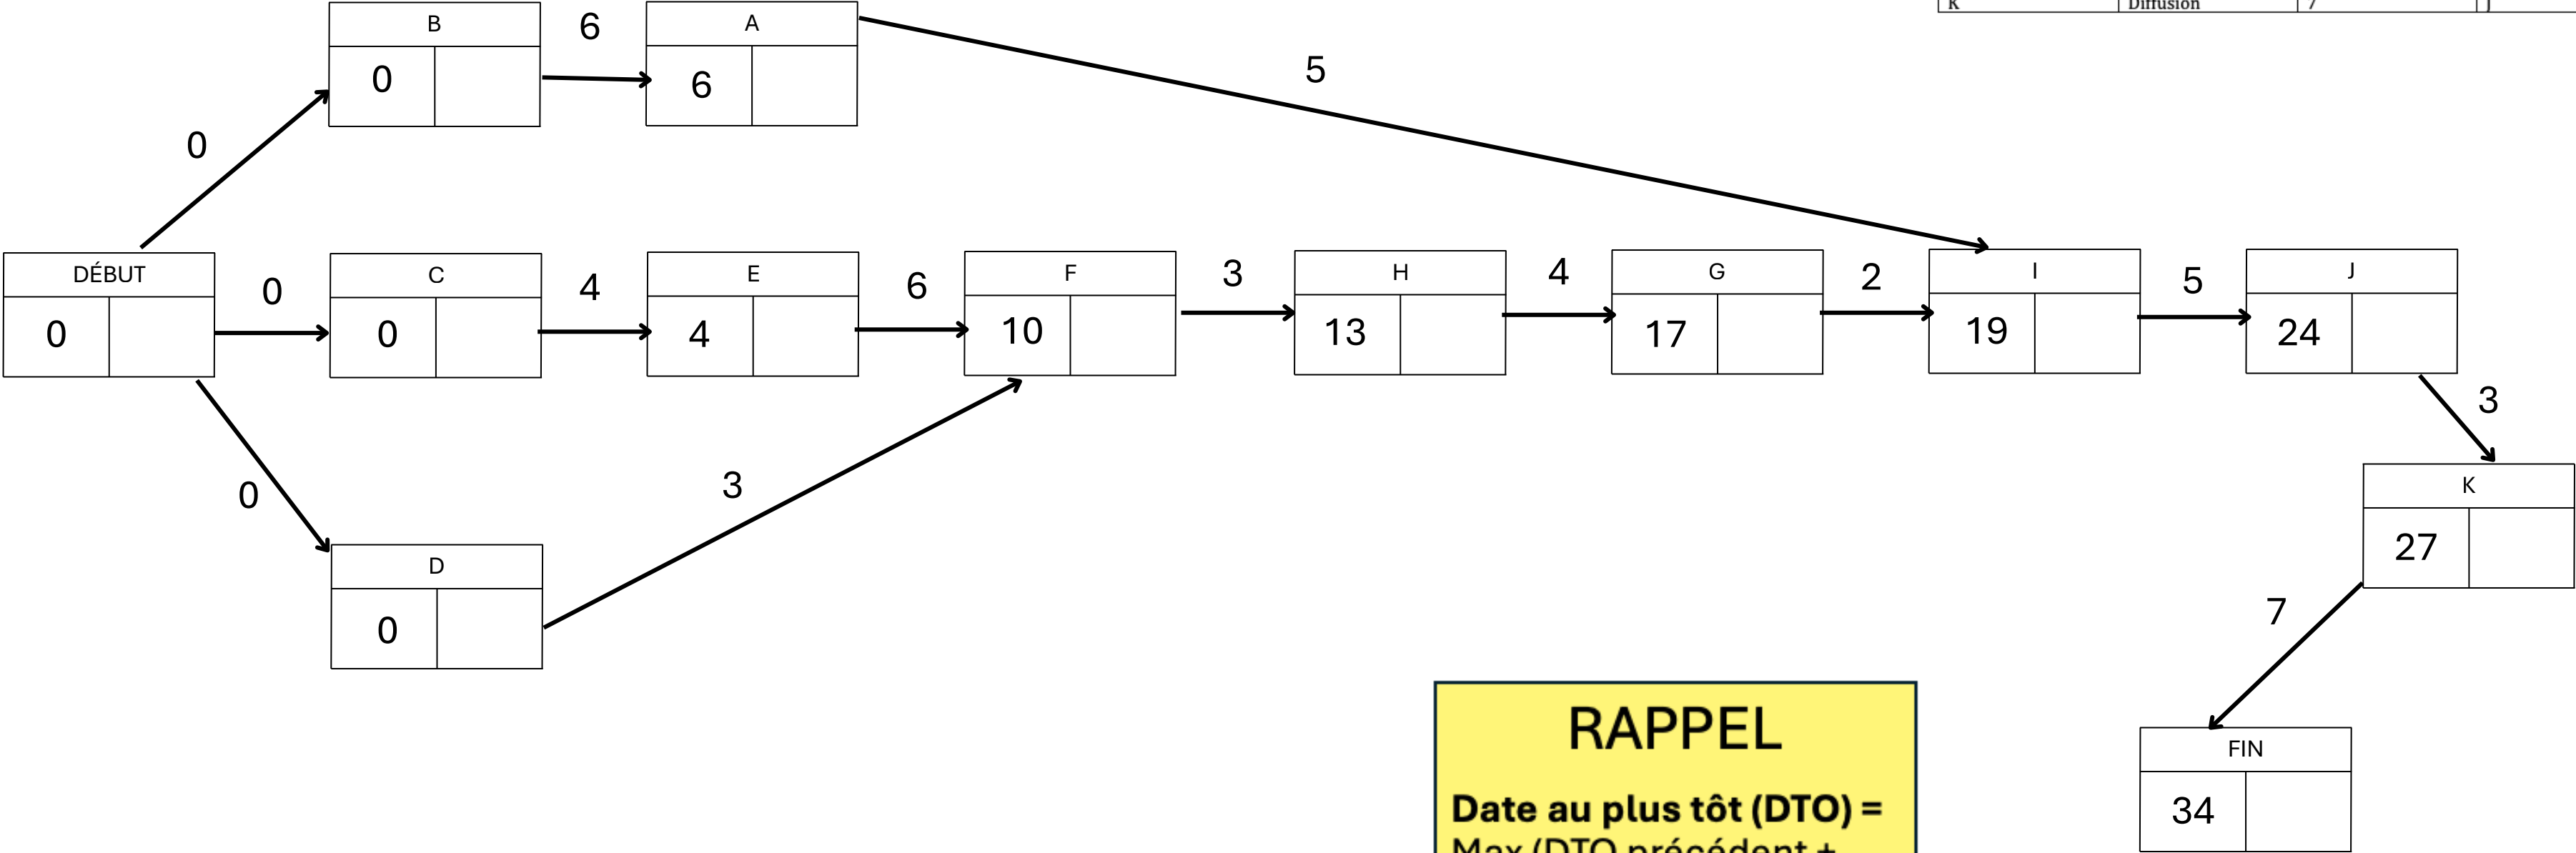


RAPPEL

Date au plus tôt (DTO) =
Max (DTO précédent +
durée tâche)

3) Présenter le graphe MPM

1	2	3	4	5	6	7	8
B	A						
C	E	F	H	G	I	J	K
D							

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

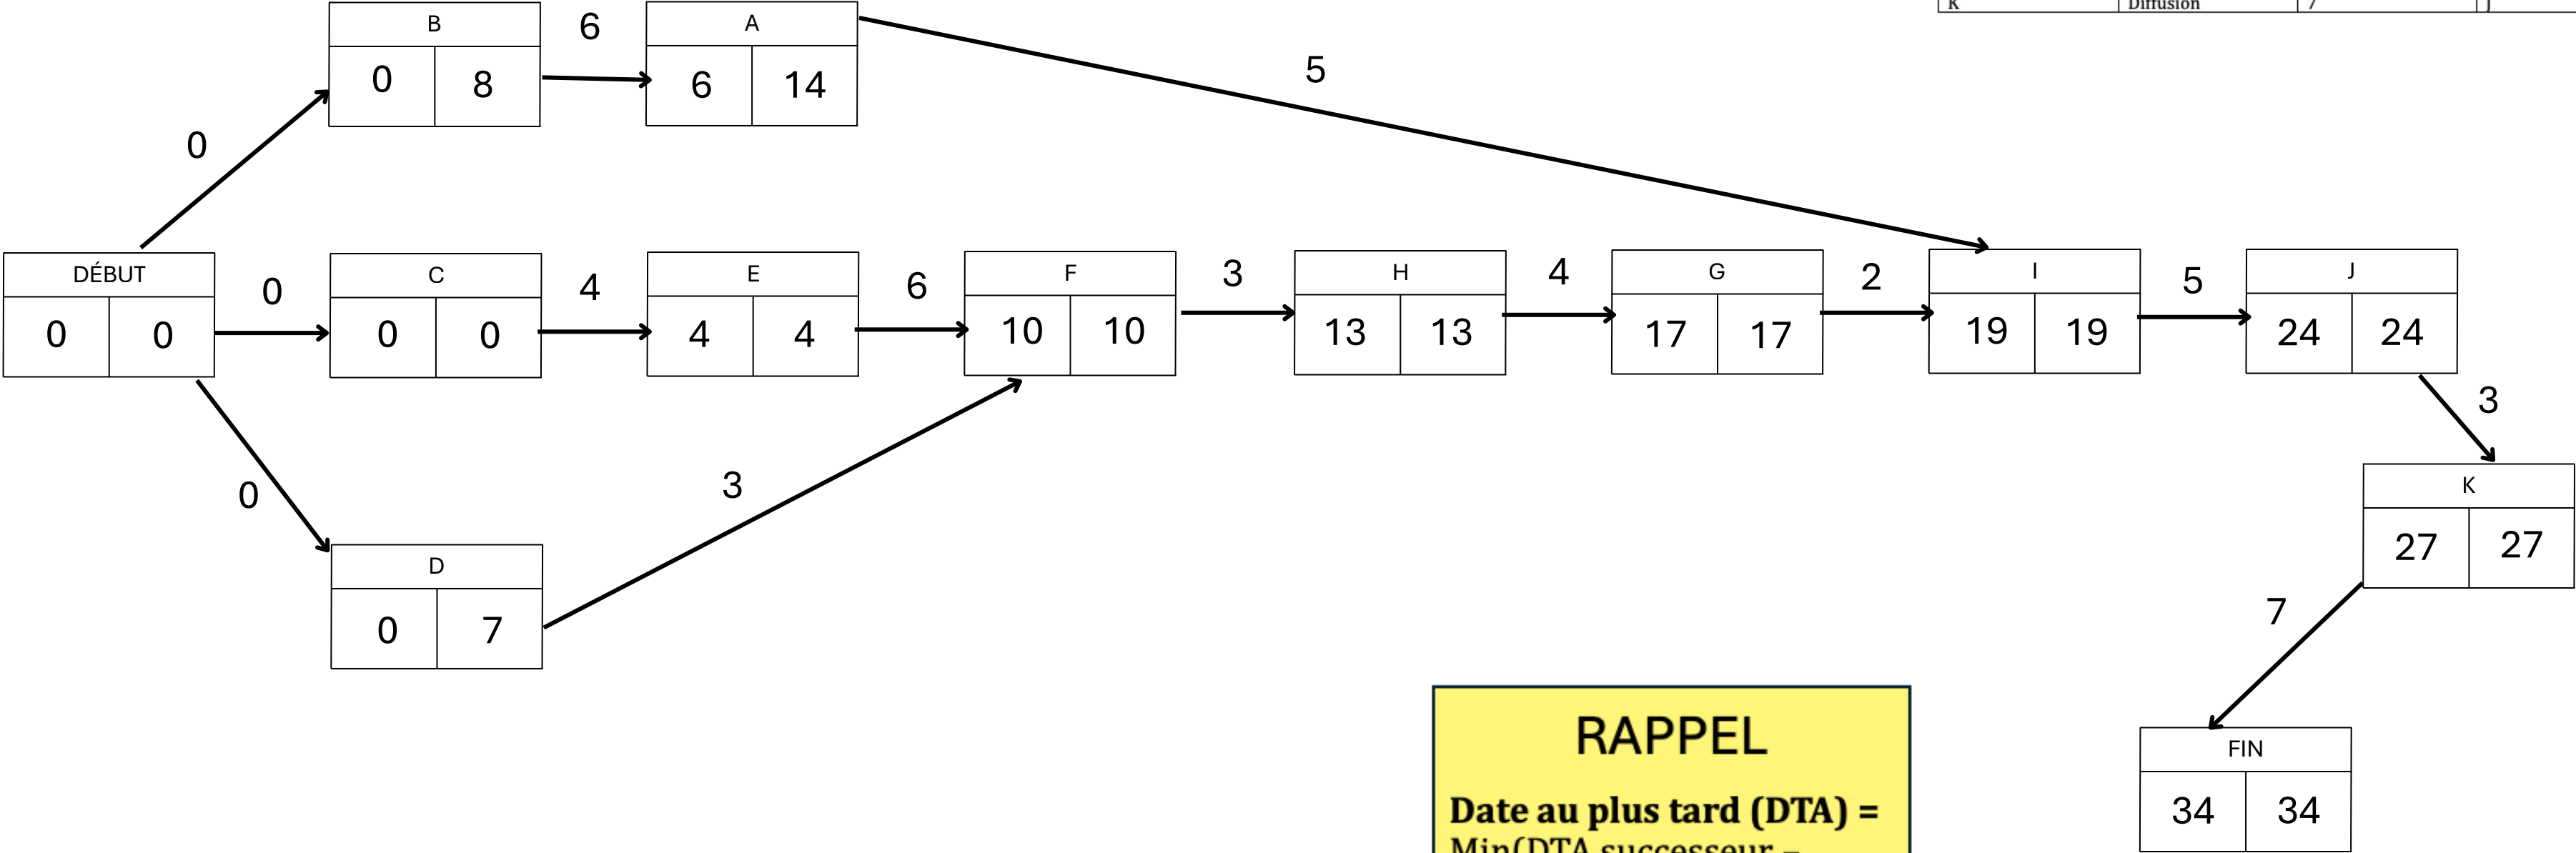

RAPPEL

Date au plus tard (DTA) =
Min(DTA successeur –
durée tâche)

4) Déterminer le chemin critique et la date de réalisation du projet

TACHES	DESCRIPTION	DUREE EN JOURS	ANTECEDANTS
A	Confection des pages 1,2 du catalogue	5	B
B	Recherche des images	6	-
C	Confection des fiches de renseignements généraux	4	-
D	Confection des fiches techniques	3	-
E	Ecriture des textes	6	C
F	Relecture	3	D E
G	Mise en page	2	H
H	Maquette	4	F
I	Tests	5	G A
J	Impression	3	I
K	Diffusion	7	J

RAPPEL
Tâche critique :
DTO = DTA

